
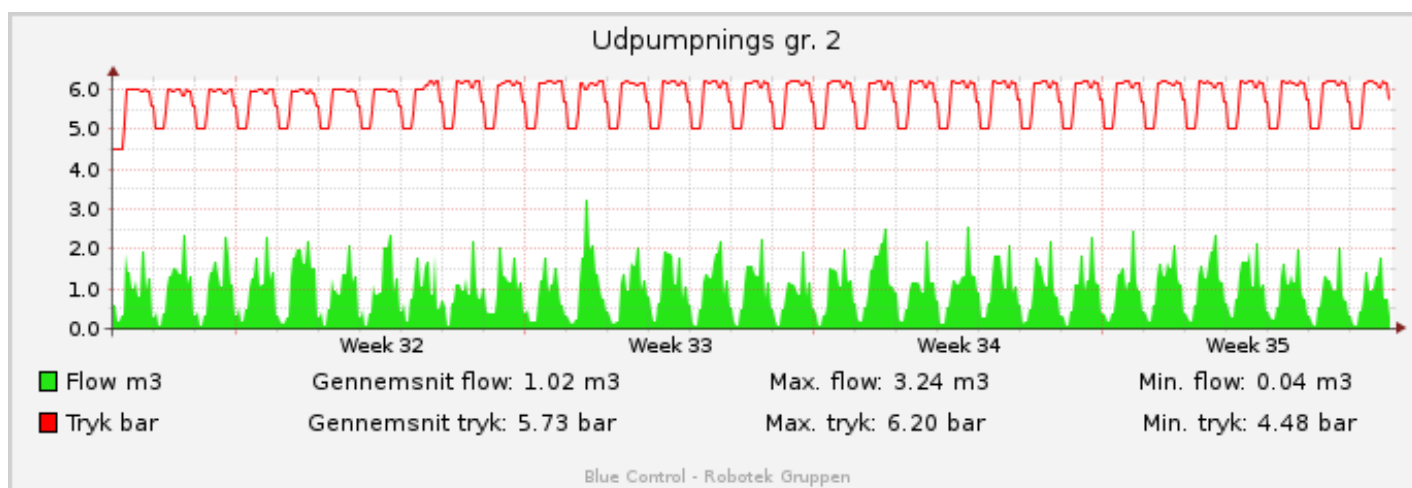


Føllenslev Vandværk

Månedssrapport 08-2013

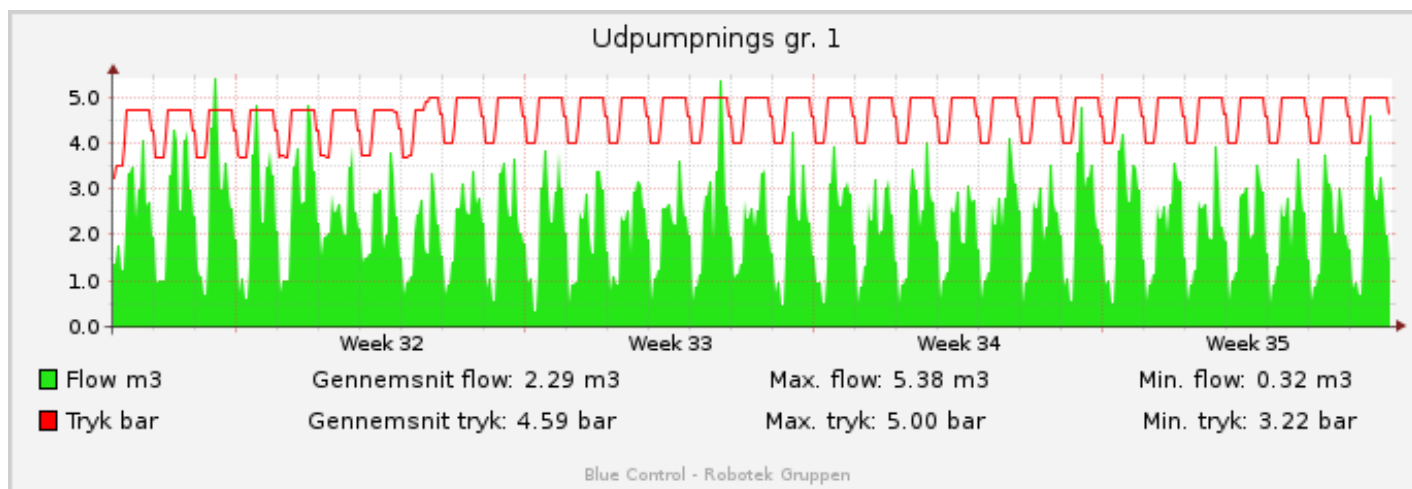

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2492 m³ Måler 1: 1725 m³ Måler 2: 767 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2480 m³ Måler 3: 2480 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1857 kWh

Total: 0.75 kWh/m³ Udpumpet: 0.53 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0.00 m³/h Tidspunkt: 01-08-13 00:00:51

Max. Flow: 11.91 m³/h Tidspunkt: 01-08-13 15:47:44

Flow måler 2:

Min. Flow: 0.00 m³/h Tidspunkt: 01-08-13 00:00:00

Max. Flow: 6.05 m³/h Tidspunkt: 02-08-13 15:20:46

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest:	-5.57 m	Lavest:	-13.49 m	Sænkning:	7.93 m
Boring 2 niveau:	Højest:	-4.06 m	Lavest:	-7.48 m	Sænkning:	3.42 m
Boring 3 niveau:	Højest:	-3.82 m	Lavest:	-6.79 m	Sænkning:	2.98 m

Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	8
Filter 2:	Antal skyl:	3

Drifttimer:

Periode:

Total:

Boring 1:	42 Timer	535 Timer
Boring 2:	124 Timer	821 Timer
Boring 3:	117 Timer	698 Timer
Pumpe 1:	467 Timer	3194 Timer
Pumpe 2:	478 Timer	3280 Timer
Pumpe 3:	419 Timer	3245 Timer
Pumpe 4:	429 Timer	3153 Timer
