

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3042,75 m ³
Indvinding	3042,75 m ³
Boring 2	1505,49 m ³
Boring 3	1551,15 m ³
TOTAL UDPUMPET	3035,83 m ³
Lavtrykszone	1920,46 m ³
Højtrykszone	1115,37 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2199 kWh
Delproces / udpumpning	1557 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

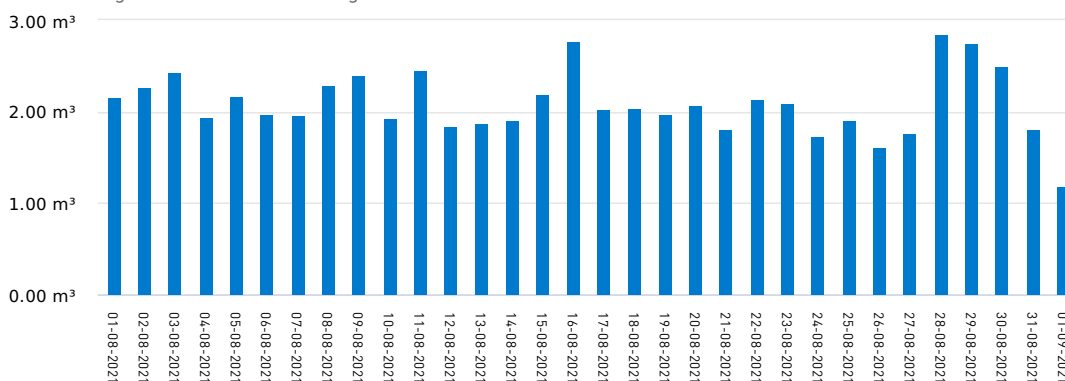

FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	159 timer
3	172 timer
PUMPER	
1	426 timer
2	398 timer
3	329 timer
4	336 timer
5	319 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,45 m	-7,46 m	2,01 m	1505,49 m ³
3	-4,59 m	-6,78 m	2,19 m	1551,15 m ³

Fordeling for indvundet vand

