

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Februar 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2886,48 m ³
Indvinding	2886,48 m ³
Boring 2	1443,33 m ³
Boring 3	1448,03 m ³
TOTAL UDPUMPET	2876,48 m ³
Lavtrykszone	1931,30 m ³
Højtrykszone	945,19 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2078 kWh
Delproces / udpumpning	1456 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

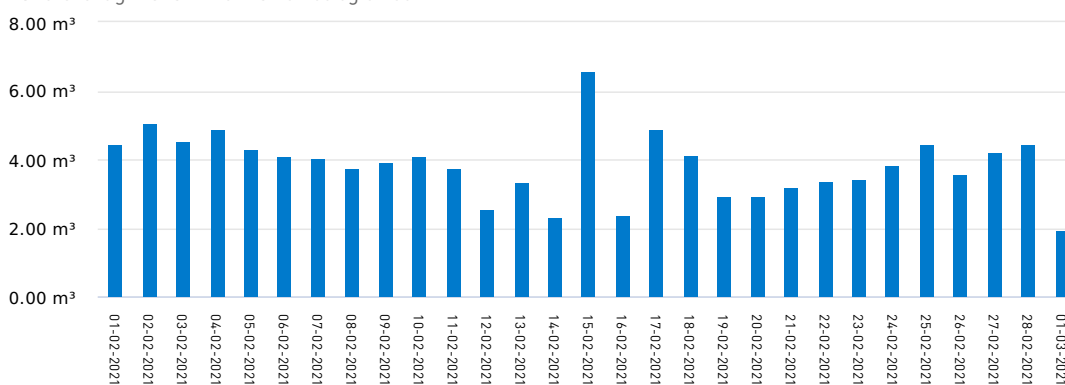

FILTRE

Filter 1	14 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	152 timer
3	161 timer
PUMPER	
1	400 timer
2	377 timer
3	300 timer
4	287 timer
5	270 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,75 m	-6,86 m	2,11 m	1443,33 m ³
3	-3,91 m	-6,14 m	2,23 m	1448,03 m ³

Fordeling for indvundet vand

