

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Marts 2023

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2194,58 m ³
Indvinding	2194,58 m ³
Boring 2	1089,74 m ³
Boring 3	1112,50 m ³
TOTAL UDPUMPET	2177,25 m ³
Lavtrykszone	1278,10 m ³
Højtrykszone	899,14 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	1597 kWh
Delproces / udpumpning	1083 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

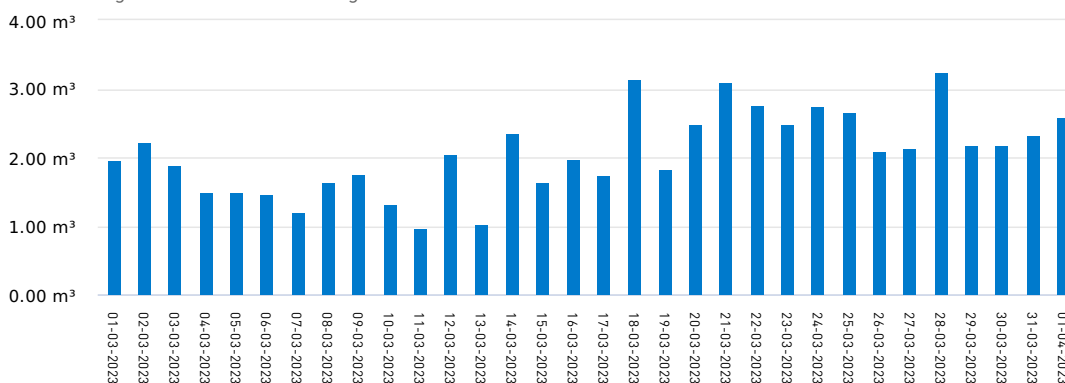

FILTRE

Filter 1	11 skyl
Filter 2	3 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	112 timer
3	123 timer
PUMPER	
1	358 timer
2	392 timer
3	418 timer
4	421 timer
5	0 timer
FILTERMOTOR	
1	2 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Marts 2023

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,64 m	-6,62 m	1,98 m	1089,74 m ³
3	-3,80 m	-5,96 m	2,16 m	1112,50 m ³

Fordeling for indvundet vand

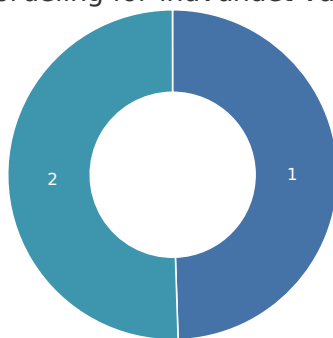

● Boring 2 : 49.5%
● Boring 3 : 50.5%



Blue Control®
BC7000
