

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	3089,44 m ³
Indvinding	3089,44 m ³
Boring 2	1561,47 m ³
Boring 3	1540,43 m ³
TOTAL UDPUMPET	3080,25 m ³
Lavtrykszone	1855,21 m ³
Højtrykszone	1225,04 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2252 kWh
Delproces / udpumpning	1593 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

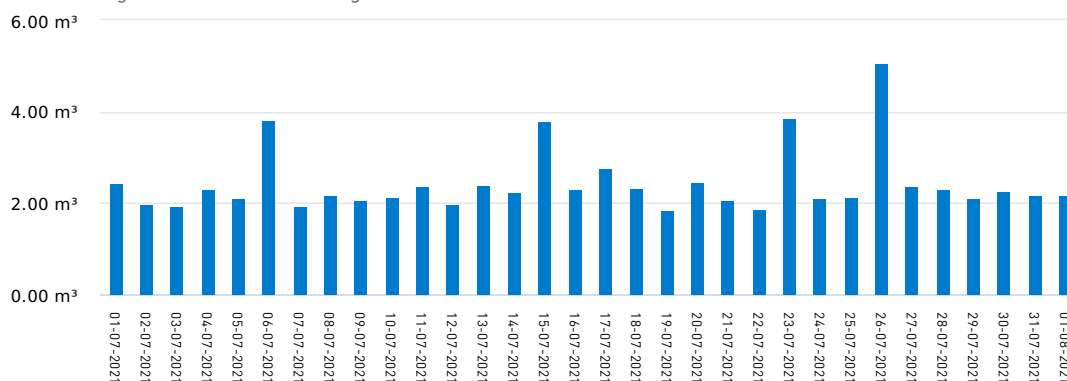

FILTRE

Filter 1	16 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	165 timer
3	171 timer
PUMPER	
1	419 timer
2	397 timer
3	337 timer
4	316 timer
5	358 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Juli 2021

Føllenslev Vandværk


2/2



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-5,30 m	-7,39 m	2,08 m	1561,47 m ³
3	-4,46 m	-6,68 m	2,23 m	1540,43 m ³

Fordeling for indvundet vand

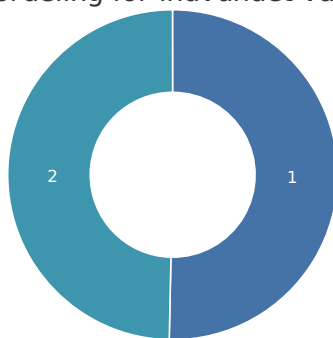

● Boring 2 : 50.3%
● Boring 3 : 49.7%



Blue Control®
BC7000
