

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Maj 2021

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDER

TOTAL INDVUNDET	2956,97 m ³
Indvinding	2956,97 m ³
Boring 2	1477,60 m ³
Boring 3	1501,54 m ³
TOTAL UDPUMPET	2950,66 m ³
Lavtrykszone	1892,18 m ³
Højtrykszone	1058,47 m ³

ELFORBRUG




ELFORBRUG	
Samlet proces	2168 kWh
Delproces / udpumpning	1530 kWh



NATFORBRUG

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

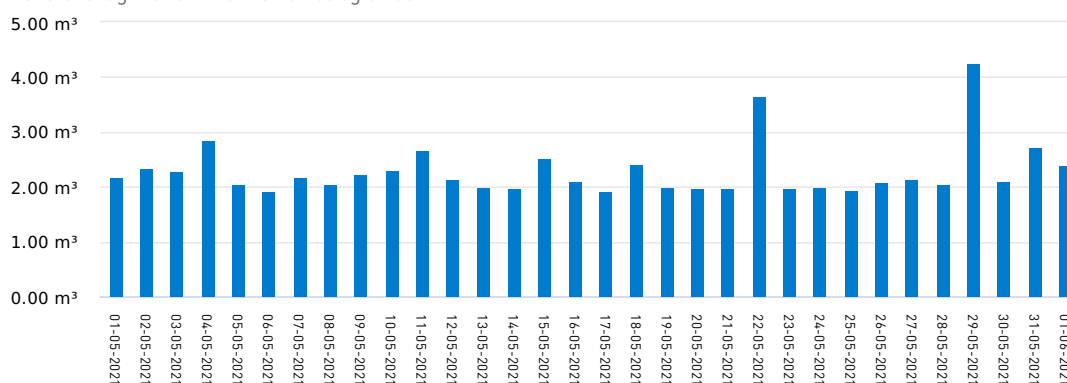

FILTRE

Filter 1	15 skyl
Filter 2	5 skyl

DRIFTTIMER



BORINGER	
2	156 timer
3	166 timer
PUMPER	
1	426 timer
2	397 timer
3	328 timer
4	316 timer
5	305 timer
FILTERMOTOR	
1	3 timer



Blue Control®
BC7000



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING	MÆNGDE
2	-4,74 m	-6,93 m	2,18 m	1477,60 m ³
3	-3,88 m	-6,22 m	2,34 m	1501,54 m ³

Fordeling for indvundet vand

