

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2025

Føllenslev Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	875,41 m ³
Indvinding	875,41 m ³
TOTAL UDPUMPNING	862,36 m ³
Lavtrykszone	455,06 m ³
Højtryks zone	407,30 m ³
ANDET	866,88 m ³
Boring 2	415,07 m ³
Boring 3	451,81 m ³

KWH FORBRUG




ELMÅLER	593 kWh
kWh Måler	593 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

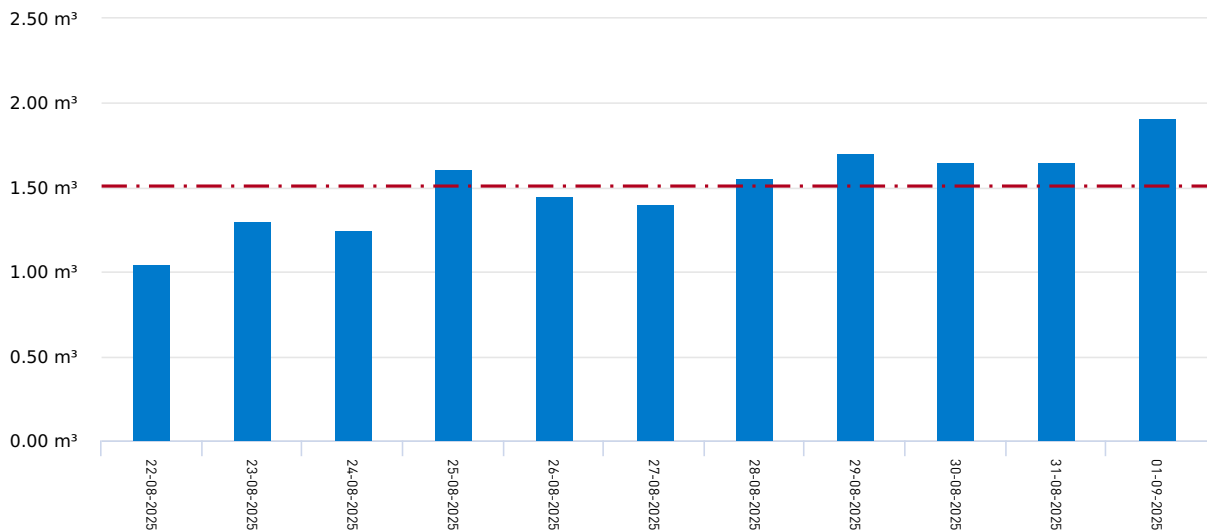

FILTRE

FILTERSKYL	8
Filter 1	6
Filter 2	2

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	-0,03 m ³
	20-08-25 11:00->12:00
Maximum	18,18 m ³
	21-08-25 11:00->12:00
Gennemsnit	3,68 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	1,45 m ³ /kWh
-------------	--------------------------

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2025

Føllenslev Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 2	1d 22t 27m
● Boring 3	2d 05t 05m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	5d 06t 16m
● Pumpe 2	4d 21t 05m
● Pumpe 3	5d 19t 07m
● Pumpe 4	5d 18t 32m

ANDET

● Skyllpumpe	01t 08m
--------------	---------



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 2	-5,29 m	-10,35 m	5,06 m
Boring 3	-4,51 m	-13,00 m	8,49 m



TÆLLERSTAND

31-08-2025 23:59:59

Boring 2	97251196 m³/h
Boring 3	99581 m³/h
Indvinding	402574 m³/h
Lavtrykszone	1230395 m³
Højtryks zone	148217 m³
kWh Måler	3038505 m³



Blue Control®
BC7000
